

برنامه زمانبندی تفصیلی دو دستگاه آسانسور روملس

ID	WBS	فعالیت	مدت زمان	شروع	پایان	2023 February	2023 March	20
						24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31		
1	1	برنامه زمانبندی تفصیلی ۲ دستگاه آسانسور پروژه	60 days	1401/11/10	1402/1/10			
2	1.1	ابلاغ قرارداد توسط کارفرما	0 days	1401/11/10	1401/11/10			
3	1.2	تجهیز کارگاه	1 day	1401/11/10	1401/11/10			
4	1.3	طراحی و مهندسی	8 days	1401/11/16	1401/11/23			
5	1.3.1	L1 آسانسور	8 days	1401/11/16	1401/11/23			
6	1.3.1.1	تنظیم صورتجلسه تحویل چاله	0 days	1401/11/16	1401/11/16			
7	1.3.1.2	نقشه برداری	1 day	1401/11/17	1401/11/17			
8	1.3.1.3	تهیه نقشه های اولیه	1 day	1401/11/16	1401/11/16			
9	1.3.1.4	تایید نقشه های اولیه	1 day	1401/11/17	1401/11/17			
10	1.3.1.5	ارسال نقشه های نهایی	1 day	1401/11/18	1401/11/18			
11	1.3.1.6	تایید نقشه های نهایی	1 day	1401/11/19	1401/11/19			
12	1.3.1.7	ارائه پیشنهادات جهت تزئینات کابین	1 day	1401/11/20	1401/11/20			
13	1.3.1.8	انتخاب و تایید تزئینات کابین توسط کارفرما	3 days	1401/11/21	1401/11/23			
14	1.3.2	L2 آسانسور	8 days	1401/11/16	1401/11/23			
15	1.3.2.1	تنظیم صورتجلسه تحویل چاله	0 days	1401/11/16	1401/11/16			
16	1.3.2.2	نقشه برداری	1 day	1401/11/17	1401/11/17			
17	1.3.2.3	تهیه نقشه های اولیه	1 day	1401/11/16	1401/11/16			
18	1.3.2.4	تایید نقشه های اولیه	1 day	1401/11/17	1401/11/17			
19	1.3.2.5	ارسال نقشه های نهایی	1 day	1401/11/18	1401/11/18			
20	1.3.2.6	تایید نقشه های نهایی	1 day	1401/11/19	1401/11/19			
21	1.3.2.7	ارائه پیشنهادات جهت تزئینات کابین	1 day	1401/11/20	1401/11/20			
22	1.3.2.8	انتخاب و تایید تزئینات کابین توسط کارفرما	3 days	1401/11/21	1401/11/23			
23	1.4	تامین	30 days	1401/11/18	1401/12/17			
24	1.4.1	L1 آسانسور	30 days	1401/11/18	1401/12/17			
25	1.4.1.1	تهیه لیست متریال	1 day	1401/11/18	1401/11/18			
26	1.4.1.2	خرید آهن آلات و ارسال به محل پروژه	2 days	1401/11/19	1401/11/20			
27	1.4.1.3	خرید و حمل ریل	1 day	1401/11/21	1401/11/21			
28	1.4.1.4	خرید و حمل درب	3 days	1401/11/22	1401/11/24			

Date: Tue 23/02/14

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical



Critical Split

Progress

Manual Progress

برنامه زمانبندی تفصیلی

دو دستگاه آسانسور روملس

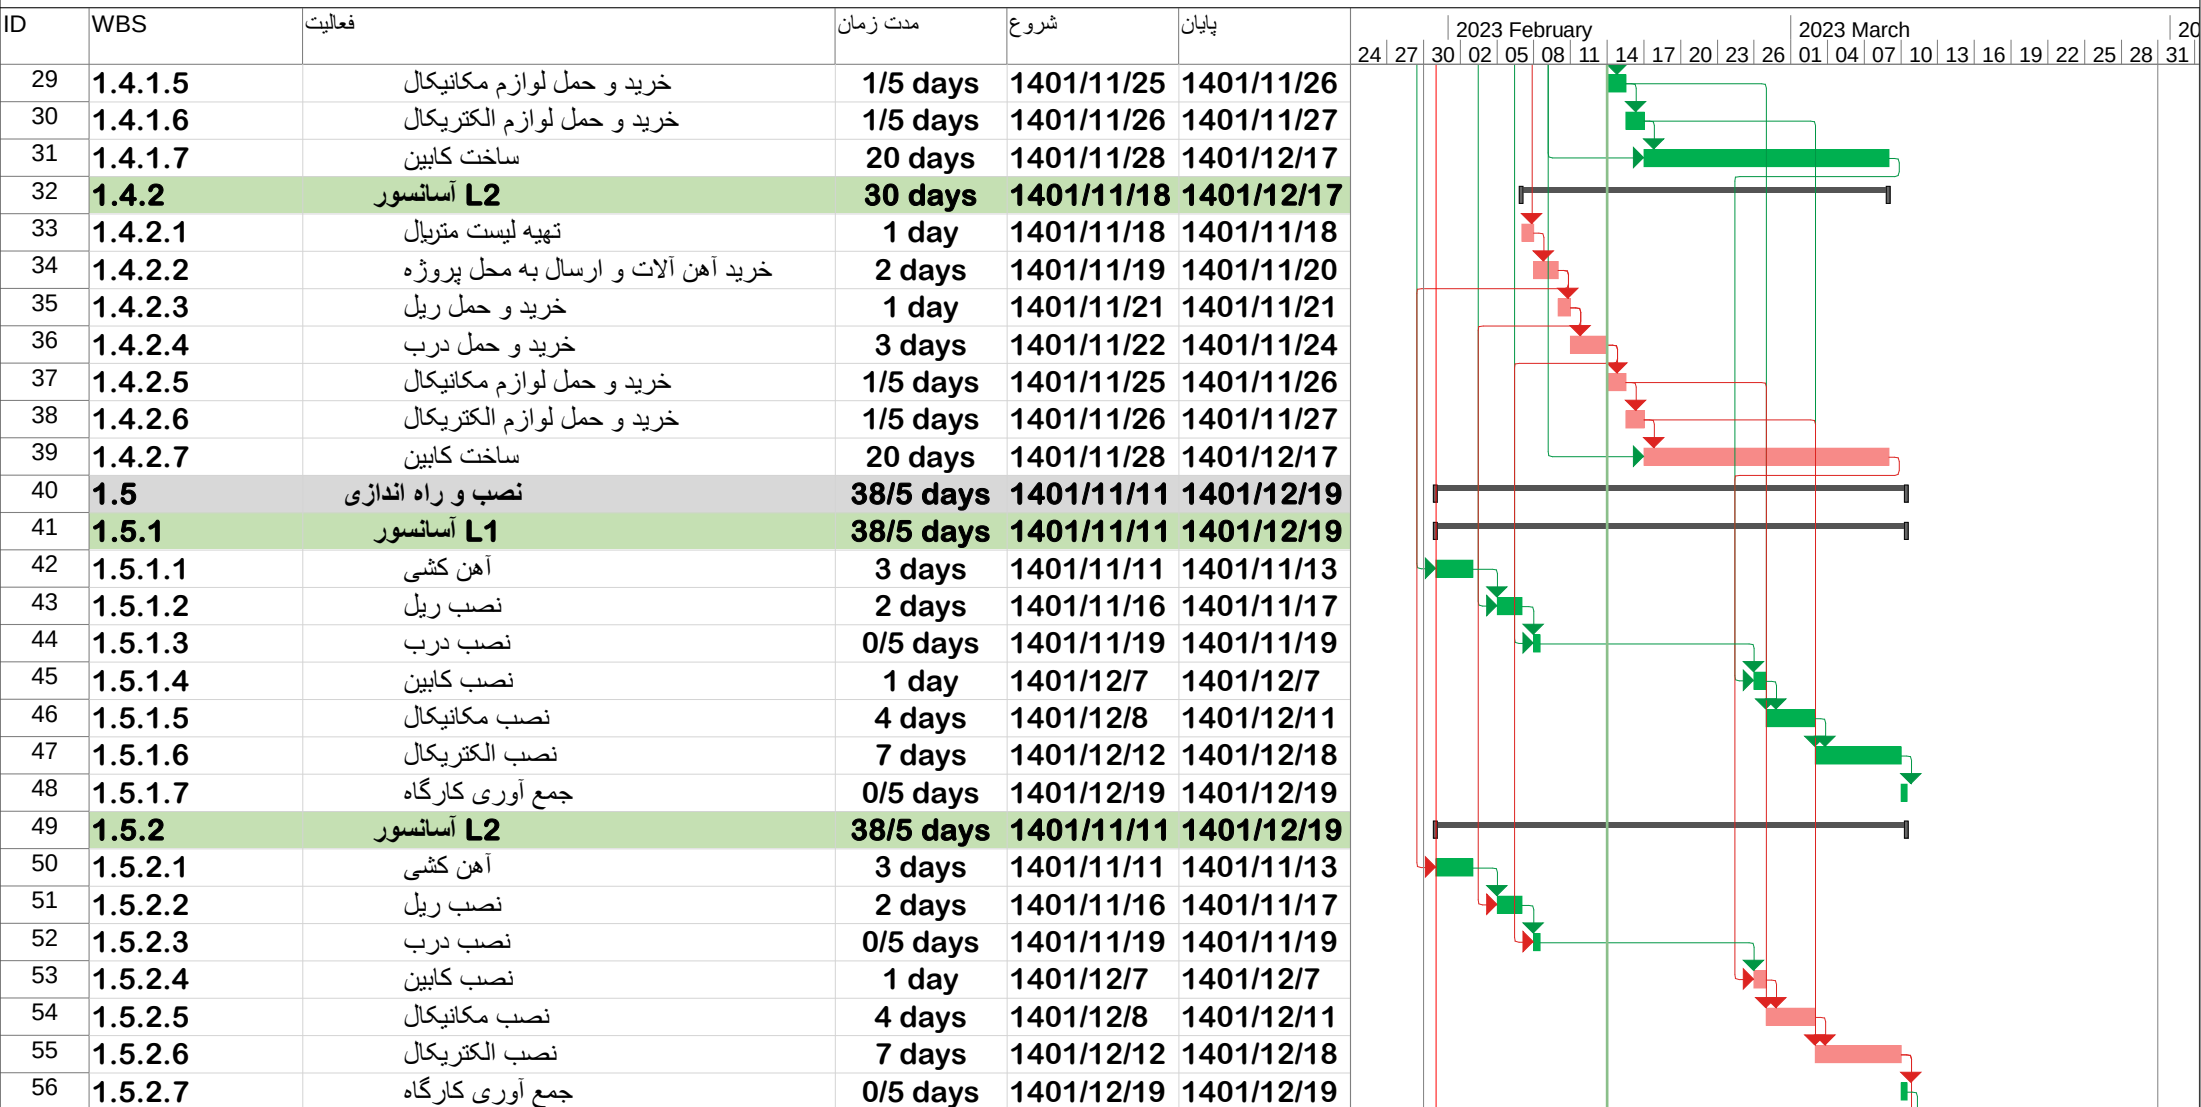

ID	WBS	فعالیت	مدت زمان	شروع	پایان	2023 February												2023 March												20
						24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31		
57	1.6	اخذ گواهی استاندارد	21 days	1401/12/19	1402/1/10																									

Date: Tue 23/02/14	Task		Inactive Task		Manual Summary Rollup		External Milestone		Manual Progress	
	Split		Inactive Milestone		Manual Summary		Deadline			
	Milestone		Inactive Summary		Start-only		Critical			
	Summary		Manual Task		Finish-only		Critical Split			
	Project Summary		Duration-only		External Tasks		Progress			
