


ID	WBS	فعالیت	Start Shamsi	Finish Shamsi	مدت زمان	Half 2, 2023					2024	
						J	A	S	O	N	D	Half 1, 2024 J F
1	1	برنامه زمانبندی تفضیلی 2 دستگاه آسانسور روملس پروژه مقدس اردبیلی	1402/5/30	1402/11/7	160 days							
2	1.1	ابلاغ قرارداد توسط کارفرما	1402/5/30	1402/5/30	0 days							
3	1.2	تجهیز کارگاه	1402/5/30	1402/5/31	2 days							
4	1.3	طراحی و مهندسی	1402/5/30	1402/6/28	30 days							
5	1.3.1	L1 آسانسور	1402/5/30	1402/6/28	30 days							
6	1.3.1.1	تنظیم صورتجلسه تحویل چاله	1402/5/30	1402/5/30	0 days							
7	1.3.1.2	نقشه برداری	1402/5/30	1402/6/1	3 days							
8	1.3.1.3	تهیه نقشه های اولیه	1402/5/31	1402/6/2	3 days							
9	1.3.1.4	تایید نقشه های اولیه	1402/6/3	1402/6/9	7 days							
10	1.3.1.5	ارسال نقشه های نهایی	1402/6/10	1402/6/19	10 days							
11	1.3.1.6	تایید نقشه های نهایی	1402/6/20	1402/6/24	5 days							
12	1.3.1.7	ارائه پیشنهادات جهت تزئینات کابین	1402/6/14	1402/6/18	5 days							
13	1.3.1.8	انتخاب و تایید تزئینات کابین توسط کارفرما	1402/6/19	1402/6/28	10 days							
14	1.3.2	L2 آسانسور	1402/5/30	1402/6/28	30 days							
15	1.3.2.1	تنظیم صورتجلسه تحویل چاله	1402/5/30	1402/5/30	0 days							
16	1.3.2.2	نقشه برداری	1402/5/30	1402/6/1	3 days							
17	1.3.2.3	تهیه نقشه های اولیه	1402/5/31	1402/6/2	3 days							
18	1.3.2.4	تایید نقشه های اولیه	1402/6/3	1402/6/9	7 days							
19	1.3.2.5	ارسال نقشه های نهایی	1402/6/10	1402/6/19	10 days							
20	1.3.2.6	تایید نقشه های نهایی	1402/6/20	1402/6/24	5 days							
21	1.3.2.7	ارائه پیشنهادات جهت تزئینات کابین	1402/6/14	1402/6/18	5 days							
22	1.3.2.8	انتخاب و تایید تزئینات کابین توسط کارفرما	1402/6/19	1402/6/28	10 days							
23	1.4	تامین	1402/6/13	1402/9/21	100 days							
24	1.4.1	L1 آسانسور	1402/6/13	1402/9/21	100 days							
25	1.4.1.1	تهیه لیست متریا	1402/6/22	1402/6/25	4 days							
26	1.4.1.2	تهیه داربست و ارسال به محل پروژه	1402/6/26	1402/6/28	3 days							
27	1.4.1.3	خرید آهن آلات و ارسال به محل پروژه	1402/6/19	1402/6/19	0 days							
28	1.4.1.4	خرید و حمل ریل	1402/6/19	1402/6/28	10 days							
29	1.4.1.5	خرید و حمل درب	1402/6/13	1402/9/11	90 days							
30	1.4.1.6	خرید و حمل لوازم مکانیکال	1402/8/22	1402/9/21	30 days							
31	1.4.1.7	خرید و حمل لوازم الکتریکی	1402/9/2	1402/9/21	20 days							
32	1.4.1.8	ساخت کابین	1402/6/19	1402/8/2	45 days							
33	1.4.2	L2 آسانسور	1402/6/13	1402/9/21	100 days							
34	1.4.2.1	تهیه لیست متریا	1402/6/22	1402/6/25	4 days							



ID	WBS	فعالیت	Start Shamsi	Finish Shamsi	مدت زمان	Half 2, 2023							2024	
						J	A	S	O	N	D		J	F
35	1.4.2.2	تهیه داربست و ارسال به محل پروژه	1402/6/26	1402/6/28	3 days									
36	1.4.2.3	خرید آهن آلات و ارسال به محل پروژه	1402/6/19	1402/6/19	0 days									
37	1.4.2.4	خرید و حمل ریل	1402/6/19	1402/6/28	10 days									
38	1.4.2.5	خرید و حمل درب	1402/6/13	1402/9/11	90 days									
39	1.4.2.6	خرید و حمل لوازم مکانیکال	1402/8/22	1402/9/21	30 days									
40	1.4.2.7	خرید و حمل لوازم الکتریکال	1402/9/2	1402/9/21	20 days									
41	1.4.2.8	ساخت کابین	1402/6/19	1402/8/2	45 days									
42	1.5	نصب و راه اندازی	1402/6/29	1402/11/7	130 days									
43	1.5.1	L1 آسانسور	1402/6/29	1402/11/7	130 days									
44	1.5.1.1	اجرای داربست	1402/6/29	1402/7/7	10 days									
45	1.5.1.2	آهن کشی	1402/7/8	1402/8/7	30 days									
46	1.5.1.3	نصب ریل	1402/8/6	1402/8/11	6 days									
47	1.5.1.4	نصب درب	1402/9/12	1402/9/17	6 days									
48	1.5.1.5	نصب کابین	1402/9/16	1402/9/25	10 days									
49	1.5.1.6	نصب مکانیکال	1402/9/22	1402/10/6	15 days									
50	1.5.1.7	نصب الکتریکال	1402/9/23	1402/11/7	45 days									
51	1.5.1.8	جمع آوری کارگاه	1402/10/28	1402/10/28	0 days									
52	1.5.2	L2 آسانسور	1402/6/29	1402/11/7	130 days									
53	1.5.2.1	اجرای داربست	1402/6/29	1402/7/7	10 days									
54	1.5.2.2	آهن کشی	1402/7/8	1402/8/7	30 days									
55	1.5.2.3	نصب ریل	1402/8/6	1402/8/11	6 days									
56	1.5.2.4	نصب درب	1402/9/12	1402/9/17	6 days									
57	1.5.2.5	نصب کابین	1402/9/16	1402/9/25	10 days									
58	1.5.2.6	نصب مکانیکال	1402/9/22	1402/10/6	15 days									
59	1.5.2.7	نصب الکتریکال	1402/9/23	1402/11/7	45 days									
60	1.5.2.8	جمع آوری کارگاه	1402/10/28	1402/10/28	0 days									
61	1.6	اخذ گواهی استاندارد	1402/10/13	1402/11/7	25 days									

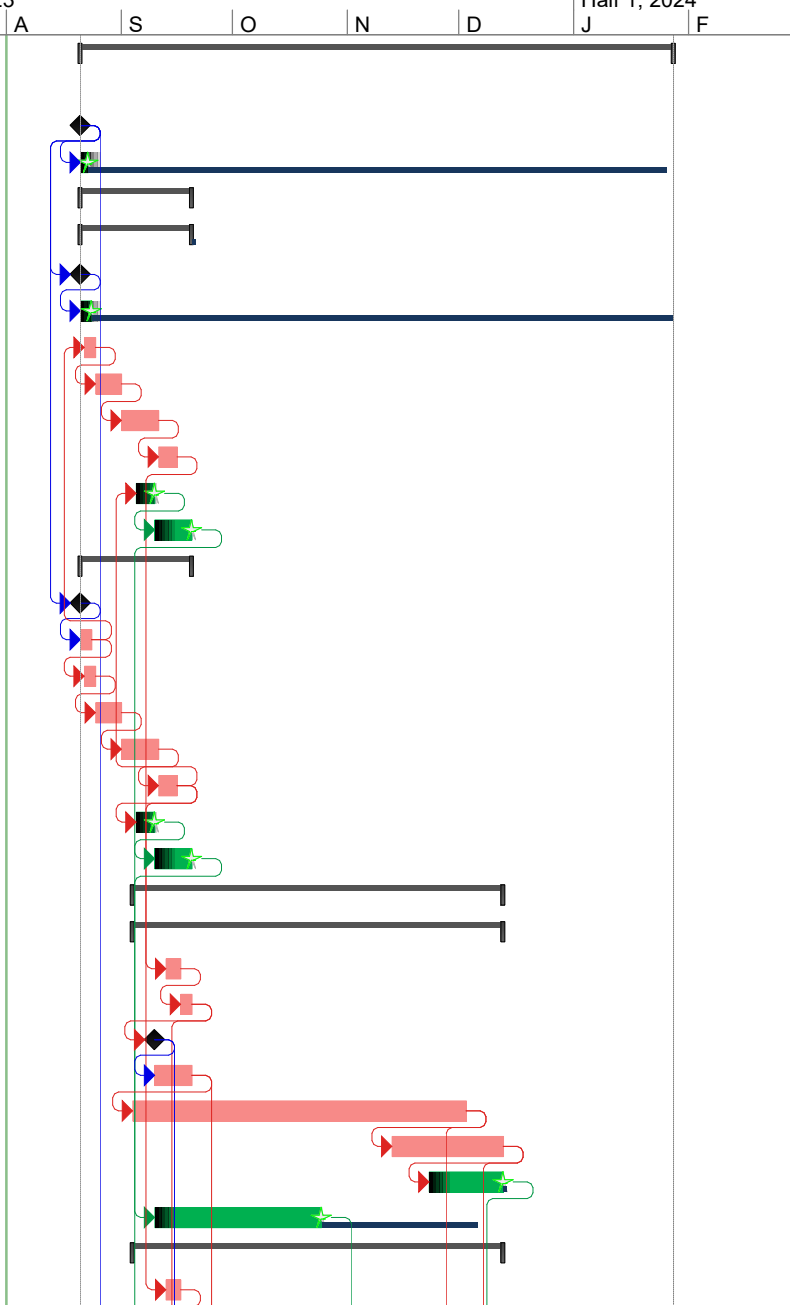
