


برنامه زمانبندی تفصیلی دو دستگاه آسانسور روملس

ID	WBS	فعالیت	مدت زمان	14	21	28	'23 Feb	04	11	18	25	'23 Mar	04	11	18	25	'23 Apr	01
1	1	برنامه زمانبندی تفصیلی ۲ دستگاه آسانسور پروژه	60 days															
2	1.1	ابلاغ قرارداد توسط کارفرما	0 days															
3	1.2	تجهیز کارگاه	1 day															
4	1.3	طراحی و مهندسی	8 days															
5	1.3.1	L1 آسانسور	8 days															
6	1.3.1.1	تنظیم صورت جلسه تحویل چاله	0 days															
7	1.3.1.2	نقشه برداری	1 day															
8	1.3.1.3	تهیه نقشه های اولیه	1 day															
9	1.3.1.4	تایید نقشه های اولیه	1 day															
10	1.3.1.5	ارسال نقشه های نهایی	1 day															
11	1.3.1.6	تایید نقشه های نهایی	1 day															
12	1.3.1.7	ارائه پیشنهادات جهت تزئینات کابین	1 day															
13	1.3.1.8	انتخاب و تایید تزئینات کابین توسط کارفرما	3 days															
14	1.3.2	L2 آسانسور	8 days															
15	1.3.2.1	تنظیم صورت جلسه تحویل چاله	0 days															
16	1.3.2.2	نقشه برداری	1 day															
17	1.3.2.3	تهیه نقشه های اولیه	1 day															
18	1.3.2.4	تایید نقشه های اولیه	1 day															
19	1.3.2.5	ارسال نقشه های نهایی	1 day															
20	1.3.2.6	تایید نقشه های نهایی	1 day															
21	1.3.2.7	ارائه پیشنهادات جهت تزئینات کابین	1 day															
22	1.3.2.8	انتخاب و تایید تزئینات کابین توسط کارفرما	3 days															
23	1.4	تامین	30 days															
24	1.4.1	L1 آسانسور	30 days															
25	1.4.1.1	تهیه لیست متریل	1 day															

Date: Tue 23/02/14	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

برنامه زمانبندی تفصیلی

دو دستگاه آسانسور روملس

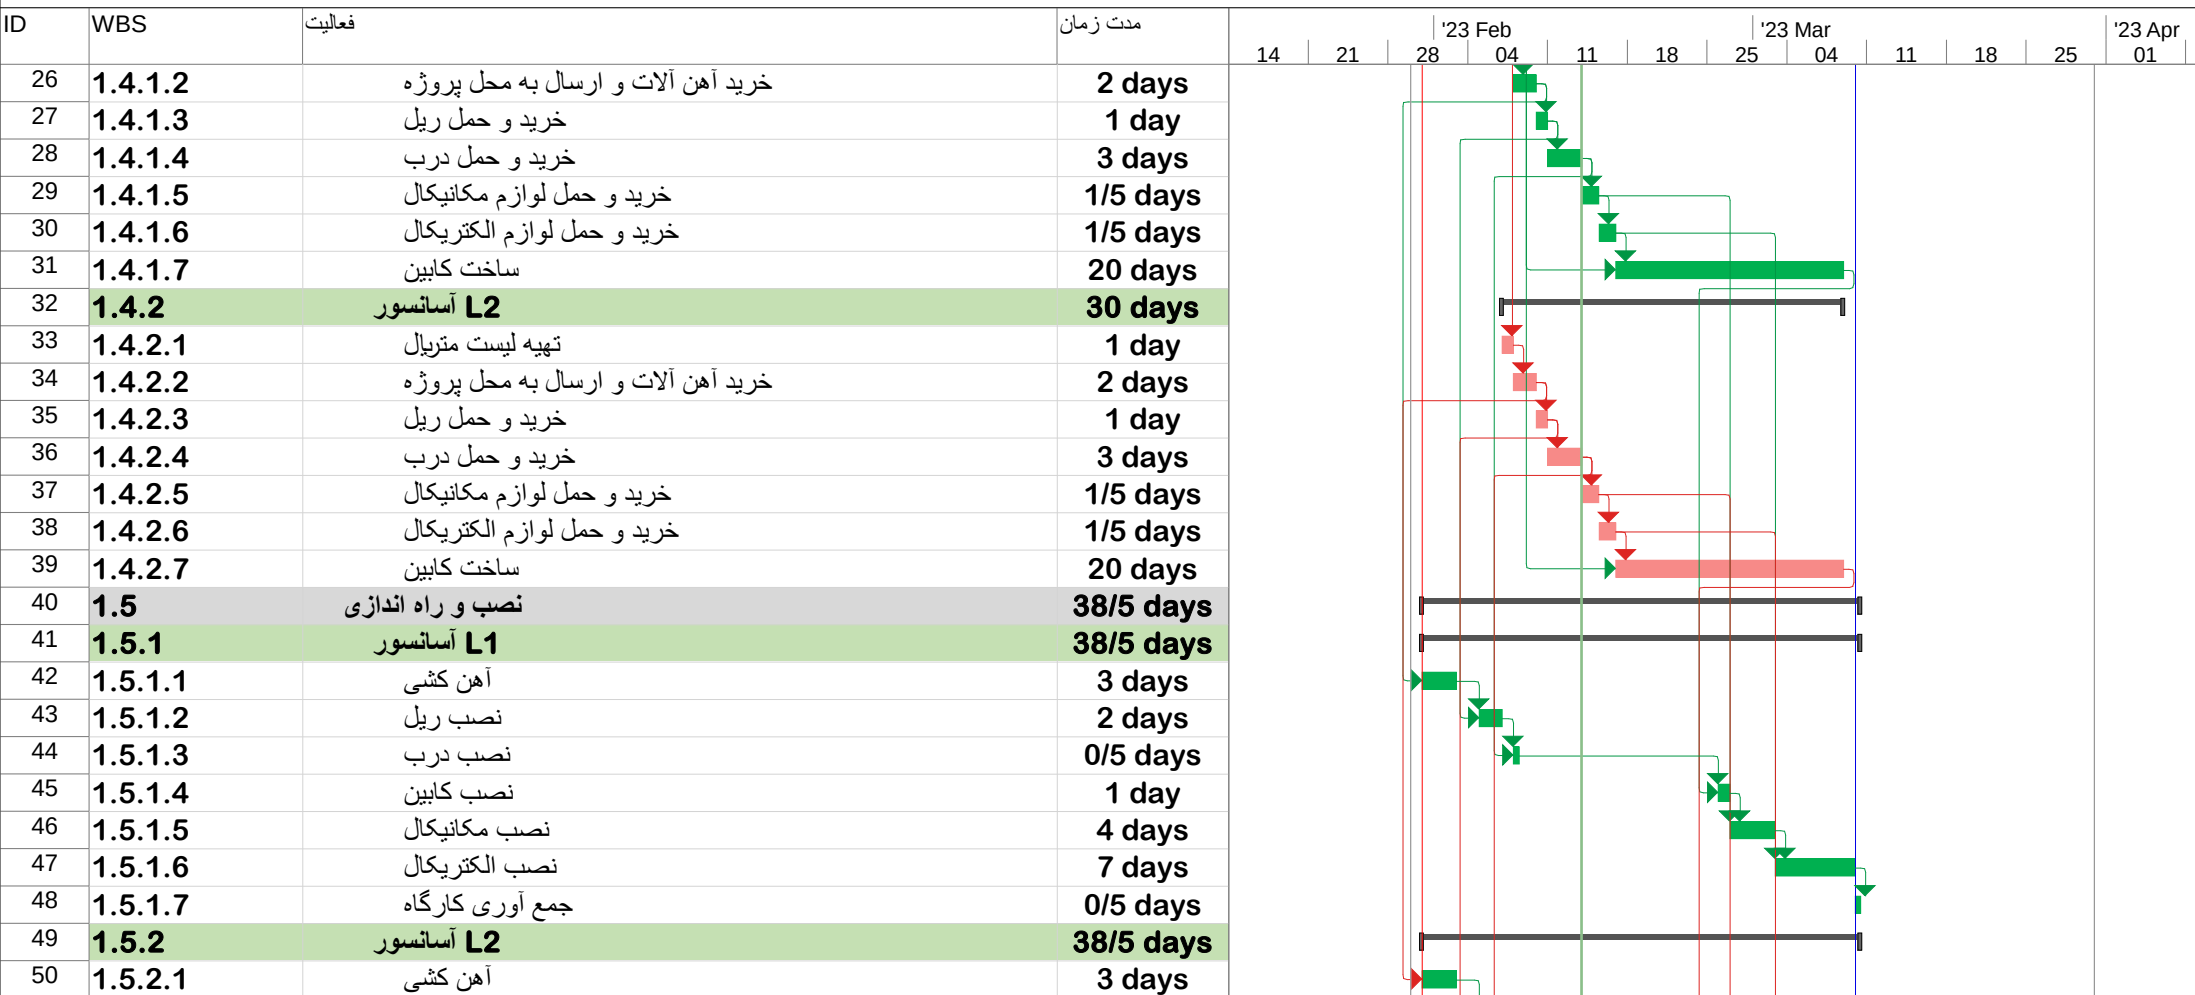

Date: Tue 23/02/14	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

برنامه زمانبندی تفصیلی


دو دستگاه آسانسور روملس

ID	WBS	فعالیت	مدت زمان	14	21	28	'23 Feb 04	11	18	25	'23 Mar 04	11	18	25	'23 Apr 01
51	1.5.2.2	نصب ریل	2 days												
52	1.5.2.3	نصب درب	0/5 days												
53	1.5.2.4	نصب کابین	1 day												
54	1.5.2.5	نصب مکانیکال	4 days												
55	1.5.2.6	نصب الکتریکال	7 days												
56	1.5.2.7	جمع آوری کارگاه	0/5 days												
57	1.6	اخذ گواهی استاندارد	21 days												

Date: Tue 23/02/14	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	




Date: Tue 23/02/14	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

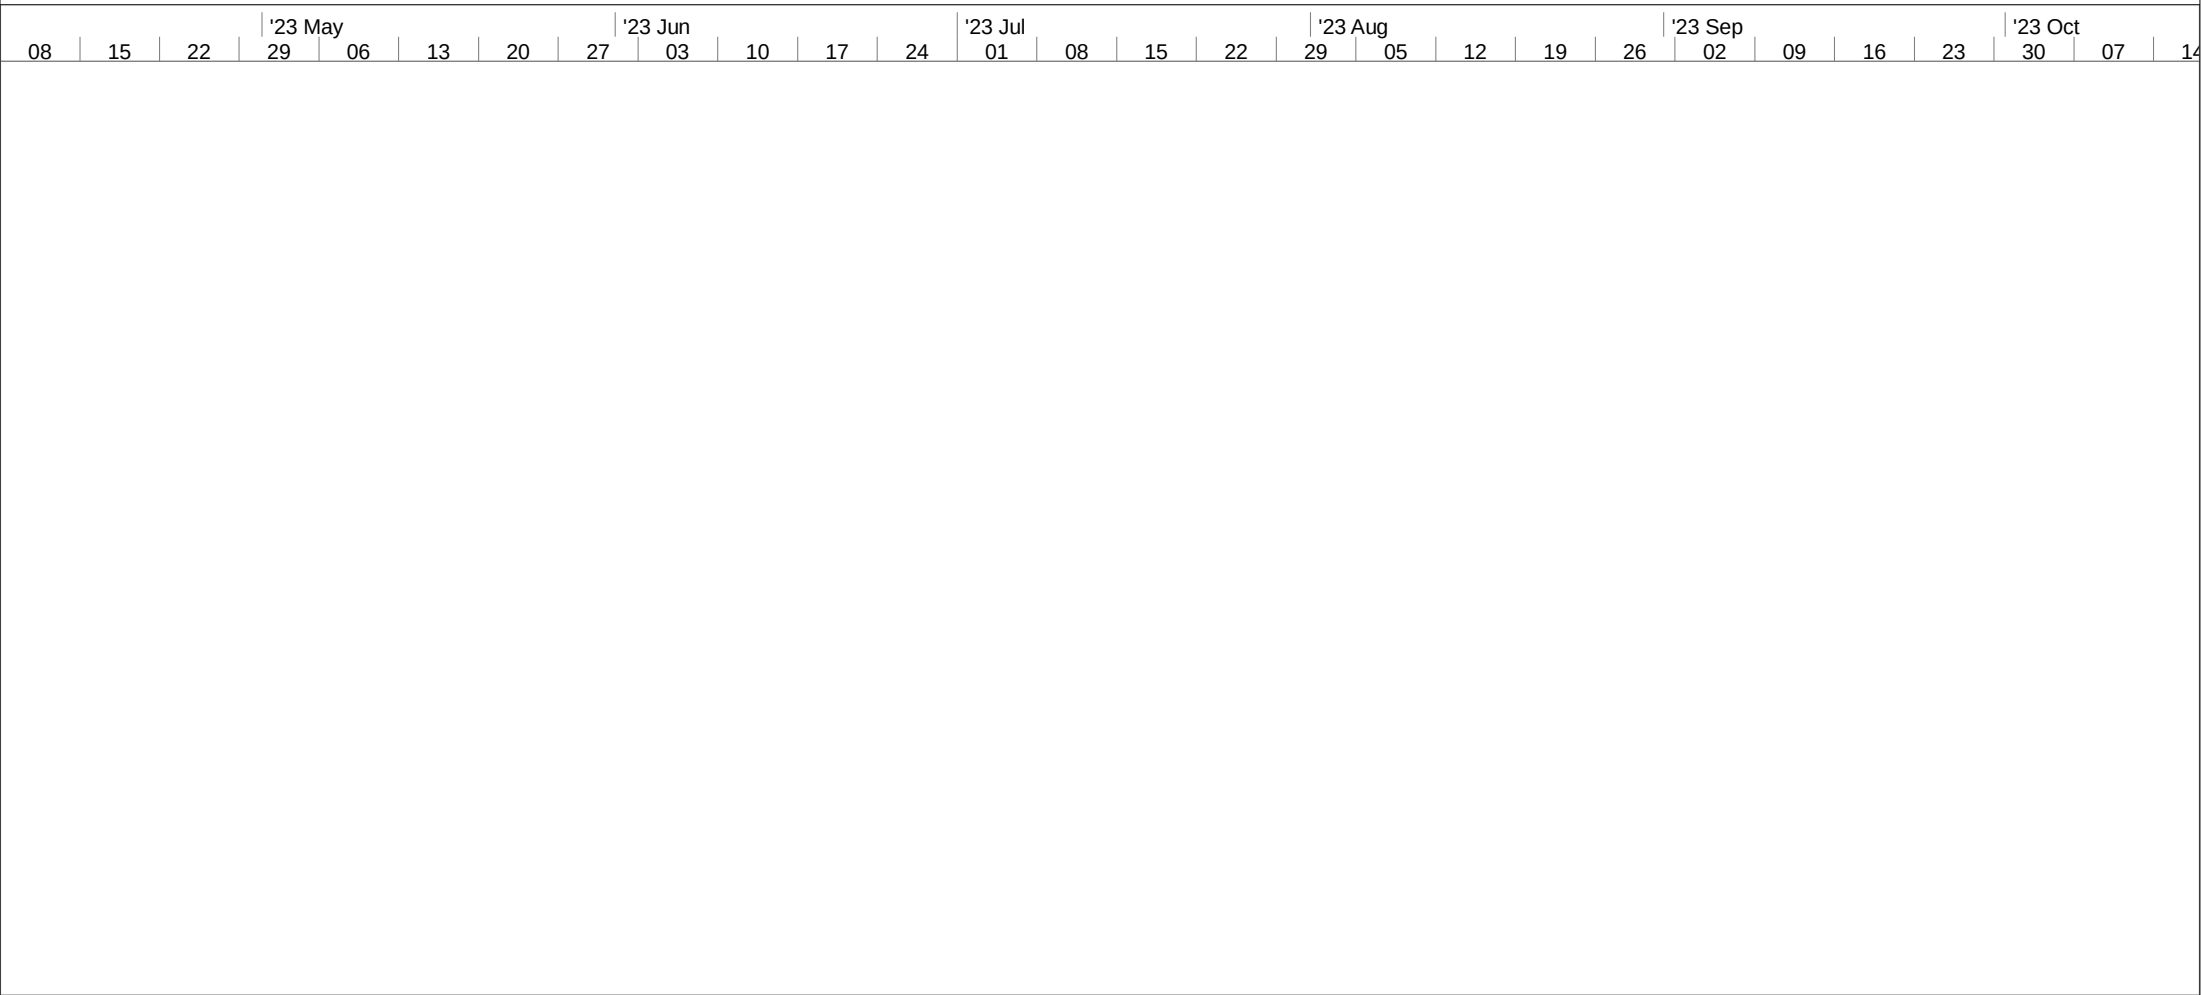

Date: Tue 23/02/14	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	

08	15	22	'23 May 29	06	13	20	27	'23 Jun 03	10	17	24	'23 Jul 01	08	15	22	'23 Aug 29	05	12	19	26	'23 Sep 02	09	16	23	'23 Oct 30	07	14
----	----	----	---------------	----	----	----	----	---------------	----	----	----	---------------	----	----	----	---------------	----	----	----	----	---------------	----	----	----	---------------	----	----



Date: Tue 23/02/14	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Critical	
	Project Summary		Manual Summary		Critical Split	
	Inactive Task		Start-only		Progress	
	Inactive Milestone		Finish-only		Manual Progress	
